

新大橋・鍛冶橋だより Vol.10

発行：島根県松江県土整備事務所 土木工務第一部 土木工務第二課

改版

「鍛冶橋だより」改め
新大橋・鍛冶橋だよりへ

いよいよ新大橋工区の工事が始まります。
今後は、新大橋工区の情報についても掲載し、より良い事業となるよう、地域の皆様に積極的に情報発信をしていきます。

鍛冶橋下部工工事（橋台）が完成しました

鍛冶橋架け替え工事（一期施工※）の下部工工事が令和7年3月に無事に完成しました。

現在、下部工前面の石積護岸が完成し、仮設構造物の撤去作業を進めています。




石積護岸の様子 (撮影 R7.6.11)



護岸・仮設構造物撤去工事は
令和7年7月に完成予定です

工事現場の様子 (撮影 R7.3)


事業スケジュール

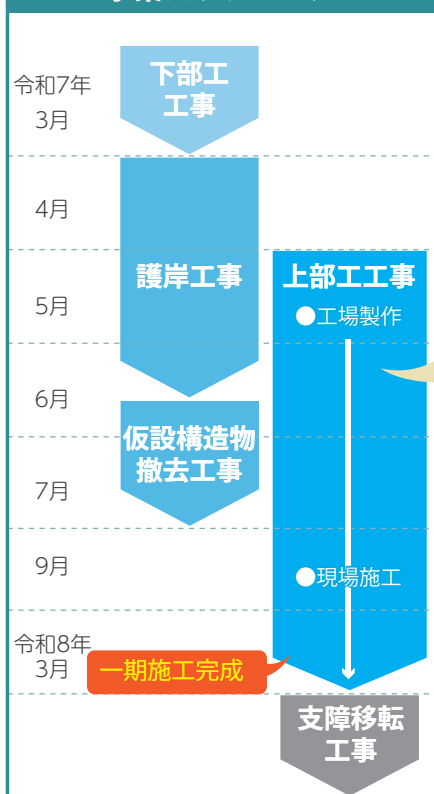

令和8年3月
完成予定

上部工工事を行い 一期施工※は完成です

令和7年5月より、橋桁の工場製作をはじめ、上部工工事の準備を進めています。令和7年9月頃より、現場での施工に着手し、令和8年3月に一期施工※が完成する予定です。

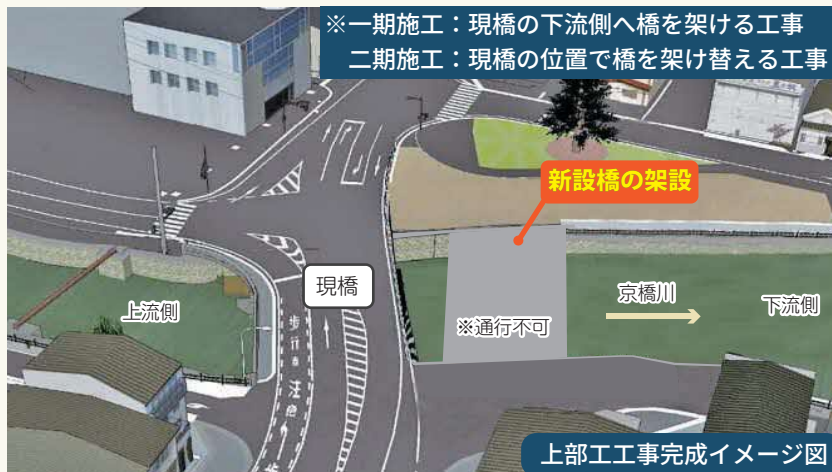

上部工工事完成イメージ図

工事に伴い、工事車両や重機の出入りがあり、通行への影響が想定されます。
引き続き、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

令和7年6月
工事着手

新大橋工区 工事が始まりました

周辺への影響にできる限り配慮しながら、工事を進めてまいります。

令和7年6月より、新大橋工区の第1期工事（伊勢宮町）が始まりました。樹木伐採と構造物撤去を行った後、仮囲いを設置し、安全を確保したうえで地盤改良工事を進めてまいります。



Q&A

【第1期工事】住民説明会を開催しました

主な質問と回答

説明会概要 【日時】令和7年6月7日（土）【場所】伊勢宮町 縁側ぎやらりい
今後、新しく工事を始める度に説明会を行い、皆様と情報を共有します。



建物の事前調査

伊勢宮町は地盤が弱く、大型車が通るだけで家が揺れます。過去にあった工事では、大きな振動が生じ、外壁にひび割れやブロックがずれたこともあります。今回の工事では建物の事前調査をしてほしいです。

今回の第1期工事は、沿道の建物から離れた位置での工事となるため、影響は無いものと考えていますが、今後建物と近接して工事を行うこともあるため、今年度事前調査を行う予定としています。

緑地帯の遊歩道と植栽伐採

川沿いの遊歩道は、工事中も使えます。遊歩道の植栽は、管理が大変なので工事に併せて伐採してほしいです。

遊歩道は、仮囲い設置後も歩行者用通路として利用できます。
遊歩道の植栽は伐採します。

アンダーパスの撤去工事

和多見町側のアンダーパス撤去工事はいつごろから始まる予定ですか。


第1期工事の完成後にアンダーパスの撤去工事を行う予定です。

新大橋全体工事の完成時期

新大橋の架け替え工事全体が完成する時期はいつになりますか。

令和16年度架け替え完成を目指し、事業を進めています。

令和7年度 新大橋工区事業スケジュール

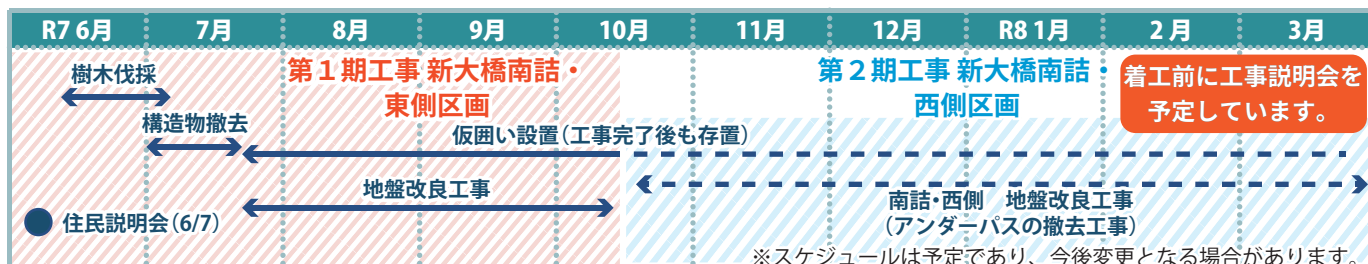

今回お示した内容については、島根県松江県土整備事務所のホームページに掲載しています。

https://www.pref.shimane.lg.jp/matsue_kendo/

お問い合わせ先

島根県松江県土整備事務所 土木工務第一部 土木工務第二課
松江市 都市整備部 大橋川治水・国県事業推進課

☎0852-32-5729
☎0852-55-5385

