

# 八戸川通信

第3号 令和2年9月

## TOPIC

### 〇各工事で作業を再開しました！

7月の豪雨の影響で各工事が一時ストップしていましたが、各工事で作業を再開しました。これから工事が本格化していく関係で土砂の運搬車両が頻繁に通行致しますが、安全には十分留意して作業を行いますので、地域の皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願い致します。

### 〇現場見学会を実施します！

7月豪雨により延期となっていた桜江中学校と浜田県土のコラボ授業で八戸川築堤工事の現場見学会を9月9日(水)に予定しています。生徒の皆様は現場でいろいろな体験してもらい、地元の皆様の生活や安全を守る為の強い堤防づくりについて理解を深めていただけたらと考えています。

#### 搬入土運行ルート



## 築堤盛土の進め方

### ①盛土材料の搬入

盛土に必要な土砂を運び込みます。



### ②盛土材料の敷均し

運び込んだ土砂をブルドーザーなどを使って平らに均します。



### ④締固め

タイヤローラーを使って適正な硬さになるよう締固めます。



### ③巻き出し厚さの確認


盛土は1層毎決まった厚さ(=巻き出し厚さ)で施工しなければいけません。1層あたり30cm以下になるように確認をします。




計画の高さまで①～④の工程を繰り返す

## 築堤の進捗状況（7月末時点）


左岸（小田圃場側） 第3期工事  
月の夜橋 下流（進捗率：45%）




右岸（三田地側） 第5期工事  
月の夜橋 下流（進捗率：5%）




左岸（小田圃場側） 第3期工事  
月の夜橋 上流（進捗率：45%）



右岸（三田地側） 第6期工事  
月の夜橋 上流（進捗率：30%）



## 工事箇所

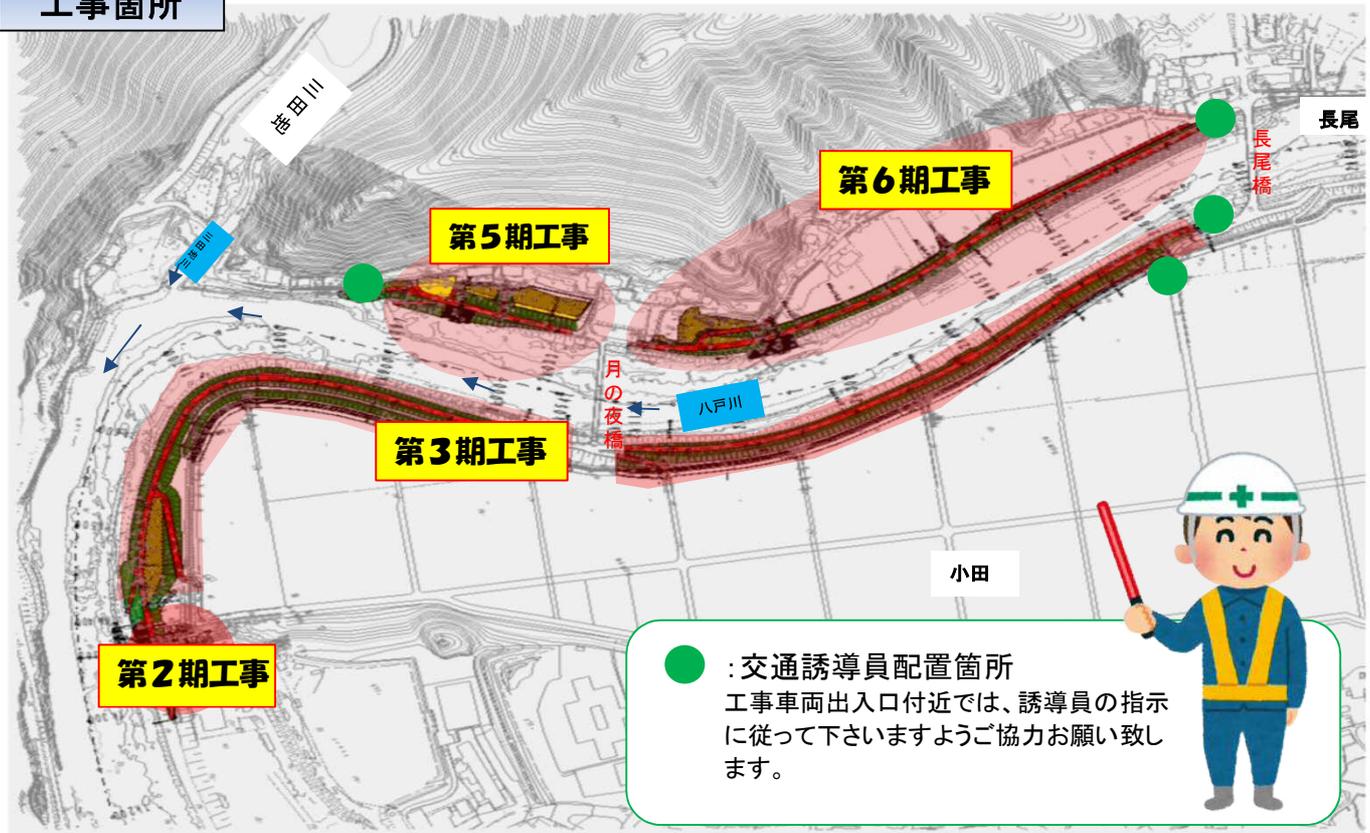

## お問い合わせ先

発注者  
島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課  
TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

施工業者  
八戸川河川災害関連事業第2期工事 (株)井上組  
☎：0855-92-0900  
八戸川河川災害関連事業第3期工事 今井産業(株)  
☎：0855-92-8140  
八戸川河川災害関連事業第5期工事 (株)井上組  
☎：0855-92-0970  
八戸川河川災害関連事業第6期工事 (株)井上組  
☎：0855-92-0970

