

八戸川通信

TOPIC

第9号 令和3年3月


〇 工事の完了について

2月末をもちまして小田樋門周辺を施工していた**第2期工事**、小田圃場側の盛土を行っていた**第3期工事**が竣工を迎えました。地域の皆様のご理解とご協力に改めてお礼申し上げます。

第3期工事の続きを第7期工事が引き続き完成高さまで盛土を行います。三田地側の現場含めて6月の出水期入りまでの堤防のかさ上げ盛土完了を目指し作業を行ってまいります。

安全第一で作業いたしますので、引き続きご理解とご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

工事全体図

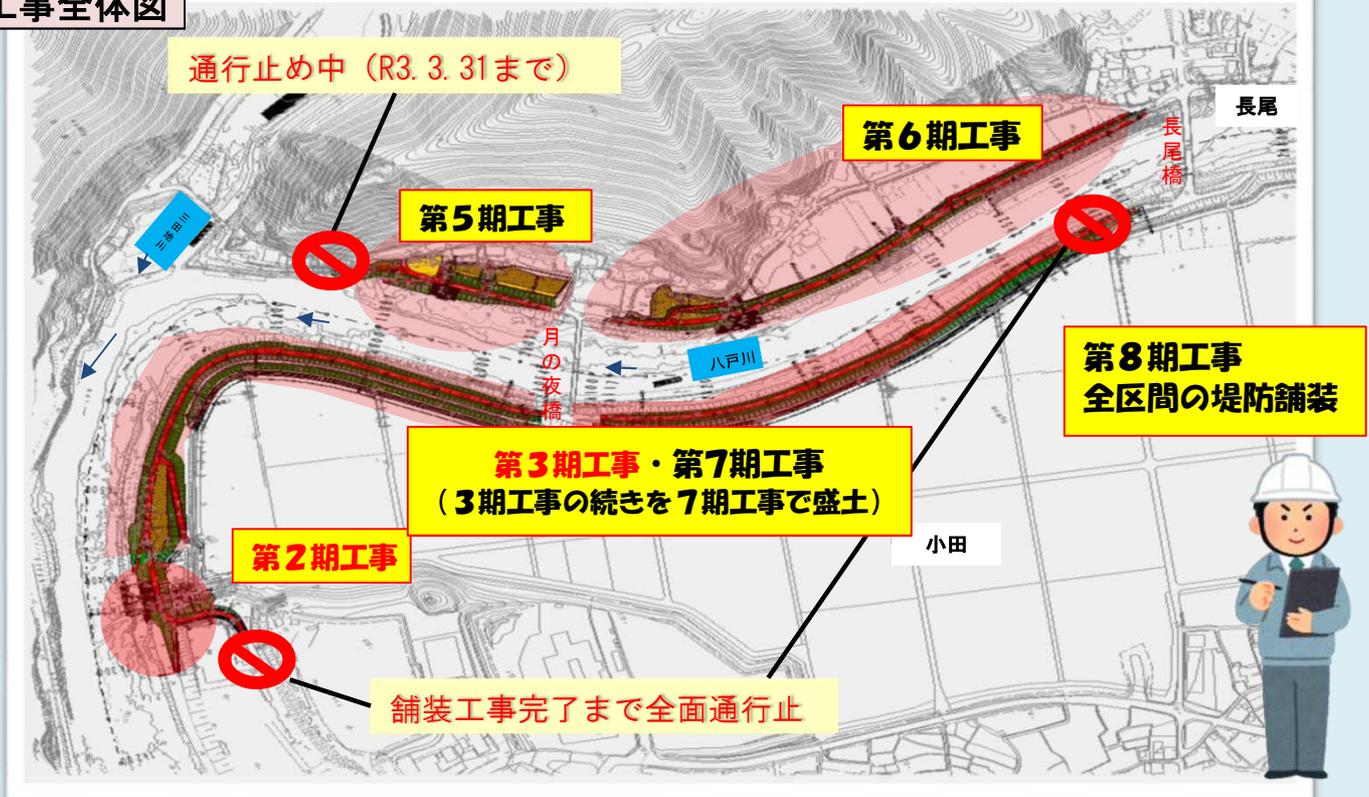

工事名 : 一級河川八戸川 河川災害関連事業 第2期工事

受注者 : (株)井上組

工期 : 令和1年9月11日～令和3年2月24日

工事金額: ¥248,727,600

工事概要: 施工延長 L=118m

樋門 N=1基

盛土工 V=6,930m³

植生工 A=1,230m²



川表側



川裏側

工事名 : 一級河川八戸川 河川災害関連事業 第3期工事

受注者 : 今井産業(株)

工期 : 令和1年12月4日～令和3年2月26日

工事金額: ¥412,438,400

工事概要: 施工延長 L=1,034m

盛土工 V=55,500m³



上流側




下流側



築堤の進捗状況（2月末時点）


左岸（小田圃場側）

月の夜橋 下流（進捗率：88%）




右岸（三田地側）

月の夜橋 下流（進捗率：79%）




左岸（小田圃場側）

月の夜橋 上流（進捗率：86%）



右岸（三田地側）

月の夜橋 上流（進捗率：39%）



日桜ロード通行再開について

冬季通行止めになっていた日桜ロードが2月24日をもって通行止め解除となりました。同日より、盛土材搬入車両についても日桜ロードを通行いたしますが、土材料の採取場所の関係で一部車両は引き続き川戸街内の県道を通行いたします。安全には十分留意して運行しますので、地域の皆様のご理解とご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。



お問い合わせ先

発注者

島根県浜田県土整備事務所 土木工務部災害工務課
TEL：0855-29-5600 FAX：0855-29-5691

施工業者

八戸川河川災害関連事業 第5期工事 (株)井上組
八戸川河川災害関連事業 第6期工事 ☎：0855-92-0970

八戸川河川災害関連事業 第7期工事 今井産業株式会社
☎：0855-92-8140

八戸川河川災害関連事業 第8期工事 今井産業(株)
☎：0855-72-0860

