

1号トンネルの安全祈願祭を行いました

5月30日（金）に、1号トンネルの安全祈願祭を行いました。安全祈願祭には、工事関係者約30名が出席し、無事故・無災害での工事完成を願いました。

順調にトンネル工事が進むと8月末に貫通し、年度末には完成する予定です。



職員の紹介

浜田河川総合開発事務所では、平成20年度は下写真の17名で4ダムの事業を担当しています。所長以下7人のメンバーが替わりました。今年度もよろしくお願いたします。

●業務グループ

事業の予算決算・入札契約・用地補償などに関する事務を担当します。

●建設第一グループ

第二浜田ダム、浜田ダム再開発のダム本体に係る調査・設計・建設などに関する事務を担当します。

●建設第二グループ

第二浜田ダム関係の付替道路や工事用道路に係る調査・設計・建設などに関する事務を担当します。

●開発グループ

波積ダム、矢原川ダムに係る調査・設計・建設などに関する事務を担当します。



お問い合わせ先

安心して暮らせる浜田のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0015 島根県浜田市竹迫町 2373-4
 TEL 0855-22-8215 FAX 0855-22-8006
<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>
 メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp

ダム建設通信

第3号 (2008.6)

浜田川総合開発事業 (第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発)


お知らせ (通行止と迂回路)

全面通行止【H20年7月1日 午前9:00より】

一般県道黒沢安城浜田線 (石見橋～東岡口三叉路まで)

浜田川総合開発事業は、平成2年度よりスタートし、平成19年度末までの進捗状況は事業費ベースで約30%となっています。そして、今春からはダム本体工事に先立つ転流工事 (仮排水路トンネル) に着手しており、今年度末には第二浜田ダム本体工事を開始することになりました。この転流工事及びダム本体工事に伴い、浜田市河内町地内において一般県道黒沢安城浜田線を通行止めする必要があります。通行止め期間は、付替県道が完成するまでの長期間となりますが、**迂回路 (下図参照)** の維持管理など浜田市と協力して行いますので皆様方のご理解とご協力をお願いします。

また今後は、工事量も増大し工事用車両などの出入りも頻繁になることが予想されますが、できる限りご迷惑をおかけしないよう努力しますので、引き続きよろしくお願いたします。

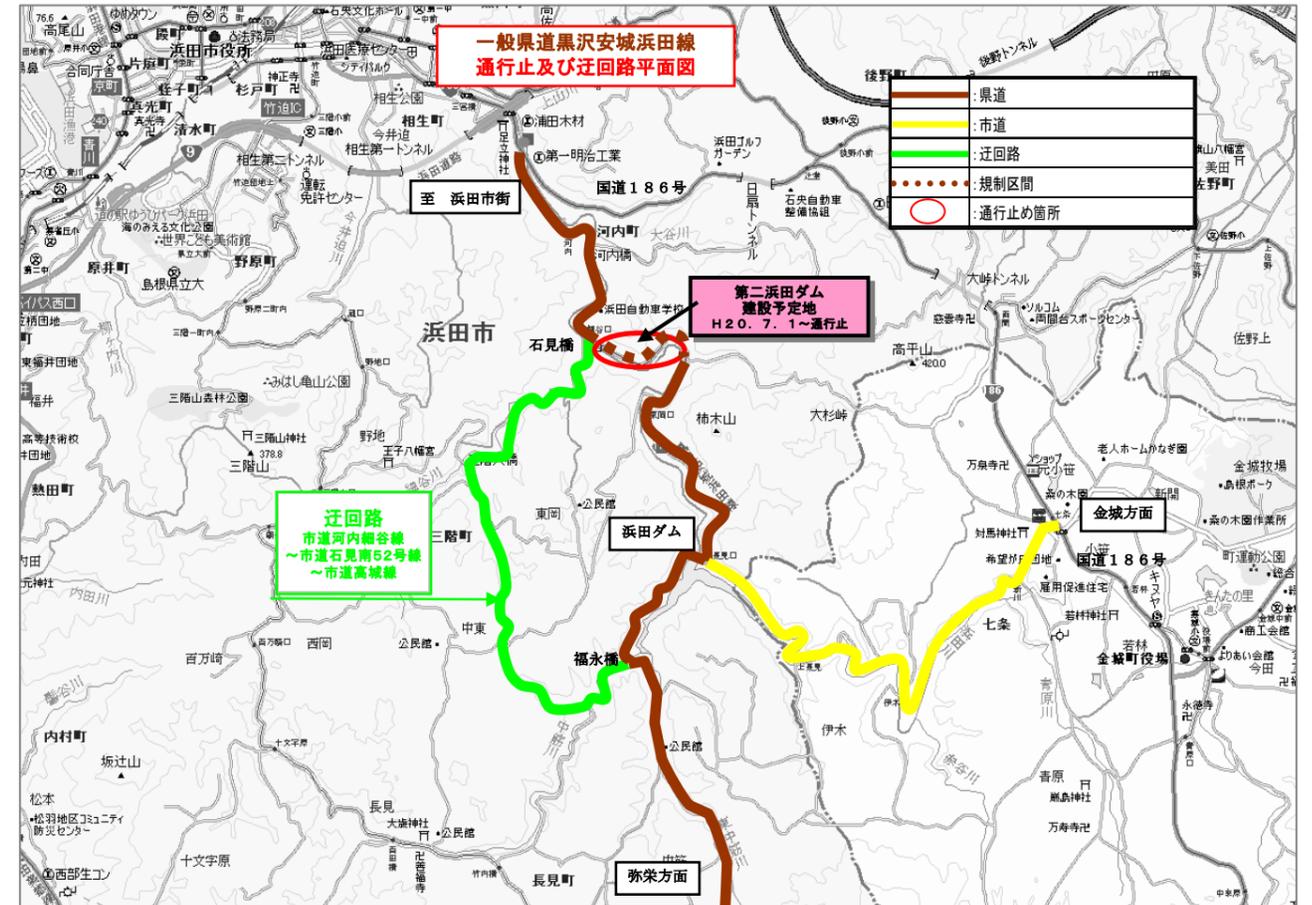

H20年度の予定

- 凡例**
- 現道部
 - 施工済区間
 - H20年度施工区間
 - 未施工区間

ダム本体建設に伴い、ダムの掘削を行う前に川の水を切り替える必要があります。転流工（仮排水路トンネル）を施工しています。転流開始は平成21年12月頃を予定しています。従って、ダムの掘削開始もこの時期になります。

平成20年度の各現場の施工区間です。今春から転流工及び1号トンネルの工事に着手しており、今年度末にはダム本体（第二浜田ダム・鞍部ダム）及び2号トンネルを発注する予定です。

県道が通れなくなることにより、柿木山国有林へのルートも無くなります。その機能回復を図るため、付替林道を施工します。

事業の進捗
全体事業費：389億円
H19まで：118億円
進捗率：約30%
H20年度：20.5億円

9号橋の下部工（橋台2基・橋脚1基）を施工します。

ダム本体建設に必要な工事用道路を確保するため、国道186号と県道黒沢安城浜田線の道路改良を行います。

ダム本体建設により、現在の県道が通れなくなります。その機能回復を図るため、付替県道を施工します。これが完成すれば、迂回路を通らずに金城・弥栄方面へ行くことができます。第二浜田ダム上流側の付替県道は平成24年度末には完成する予定です。



現在、1号トンネルを施工中です。掘削は40mまで進みました。今年度末の完成を目指しています。

11号橋の下部工（橋台1基）を施工します。



【ダム本体下流の河床掘削状況】
 左岸側（写真の右側）の河床を掘削し、水の流れる断面を確保します。
 右岸側はコンクリート擁壁を作り、仮排水路トンネルの施工ヤードを確保します。



【1号トンネルの掘削状況】

工事中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

