

三階小学校二年生が「町探検」で来所しました。

平成21年7月3日（金）に、三階小学校二年生12名が町探検学習として浜田河川総合開発事務所を訪問しました。

ダムについて約1時間勉強をしましたが、児童の皆さんは積極的に質問をしていました。また、実際にダムの模型に水を流して実験を行いました。児童の皆さんは楽しく学習することができたようでした。



クリーンアップ作戦を実施しました。

平成21年8月5日（水）に、浜田市河内町、三階町にてクリーンアップ作戦を実施しました。第二浜田ダム関連工事を請け負っている施工業者などで組織する「浜田川総合開発事業安全対策会議」の恒例行事として、浜田河川総合開発事務所、浜田市役所と施工業者の3企業体、及び5社の参加者42人が約一時間半、第二浜田ダム周辺道路（三宮橋付近～石見橋～三階大橋～中東口バス停～福永橋付近）と周辺河川（三宮橋付近～石見橋）に分散して清掃活動を行いました。

これからダム工事も本格化していきますが、これを機に現場周辺の美化をさらに徹底していきたいと考えています。



ダム建設通信

第8号 (2009.9)

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）

第二浜田ダム本体建設工事の起工式を行いました。

平成21年9月11日（金）に、第二浜田ダム本体建設工事の起工式を浜田市河内町のダム工事現場で行いました。

起工式には、請負業者、地元関係者、県、市など約50名が参加し、工事の起工を祝うと共に、無事故・無災害での工事完成を祈願しました。始めに、三柴鹿島建設（株）中国支店長が鹿島・五洋・今井特別共同企業体を代表して「我々三社が力を合わせて、精一杯、安全に、良いものを限られた工期内で作り上げていきたい。」と挨拶し、続いて、鳥屋島根県土木部長が「第二浜田ダムの早期完成に努め、浜田市の安全、安心な地域の実現に尽くすので、関係の皆様の一層のご理解とご協力をお願いしたい。」と挨拶しました。宇津浜田市長からは「引き続き地域の皆さんと共にダム本体の早期完成に取り組んでいく所存です。地元の皆さんには、通行止めに伴う迂回や、工事車両の増加による生活上のご不便をかけることになるが、事業の必要性をご理解頂き、ご協力をお願いしたい。」と挨拶がありました。

工事の紹介として、滝本浜田河川総合開発事務所長が事業概要を説明し、近藤企業体工事事務所長が工事概要を説明しました。



現在、第二浜田ダム本体建設工事は、本体ダム部、鞍部ダム部で立木の伐採を行っています。この後、平成21年12月頃から鞍部ダム部の掘削を、平成22年4月から本体ダム左岸天端部の掘削を行っていく予定です。

また、今後はダム本体工事が本格的になります。これに伴い、工事用車両等の出入りも頻繁になりますが、できる限りご迷惑をお掛けしないよう努めますので、引き続きよろしくお祈りいたします。

お問い合わせ先

安心して暮らせる浜田のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0015 島根県浜田市竹迫町 2373-4
TEL 0855-22-8215 FAX 0855-22-8006
<http://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>
メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp

現在の状況



<河内橋>
8号橋方面
<9号橋>

【9号橋周辺部状況】

現在、9号橋下部工の工事が終わり、これから9号橋の上部工の工事と8～9号橋の区間の道路工事を行います。



【鞍部ダム部 伐採状況】

立木の伐採が終わった後、平成21年12月頃から掘削を開始する予定です。



【第二浜田本体ダム部 左岸伐採状況】

立木の伐採が終わった後、平成22年4月頃から天端部の掘削を開始する予定です。



【2号トンネル施工状況】

現在、全施工区間480mの内、150mの位置まで掘削が進んでいます。



<10号橋>
<国道186号>

【交差点改良部状況】

現在、法面の工事が終わり、これから道路改良、舗装の工事に入っていきます、今年度中の供用を予定しています。




【第二浜田本体ダム部 右岸伐採状況】

立木の伐採が終わった後、平成22年9月頃から掘削を開始する予定です。

凡例

- 現道部
- 施工済区間
- H21年度施工区間
- 未施工区間

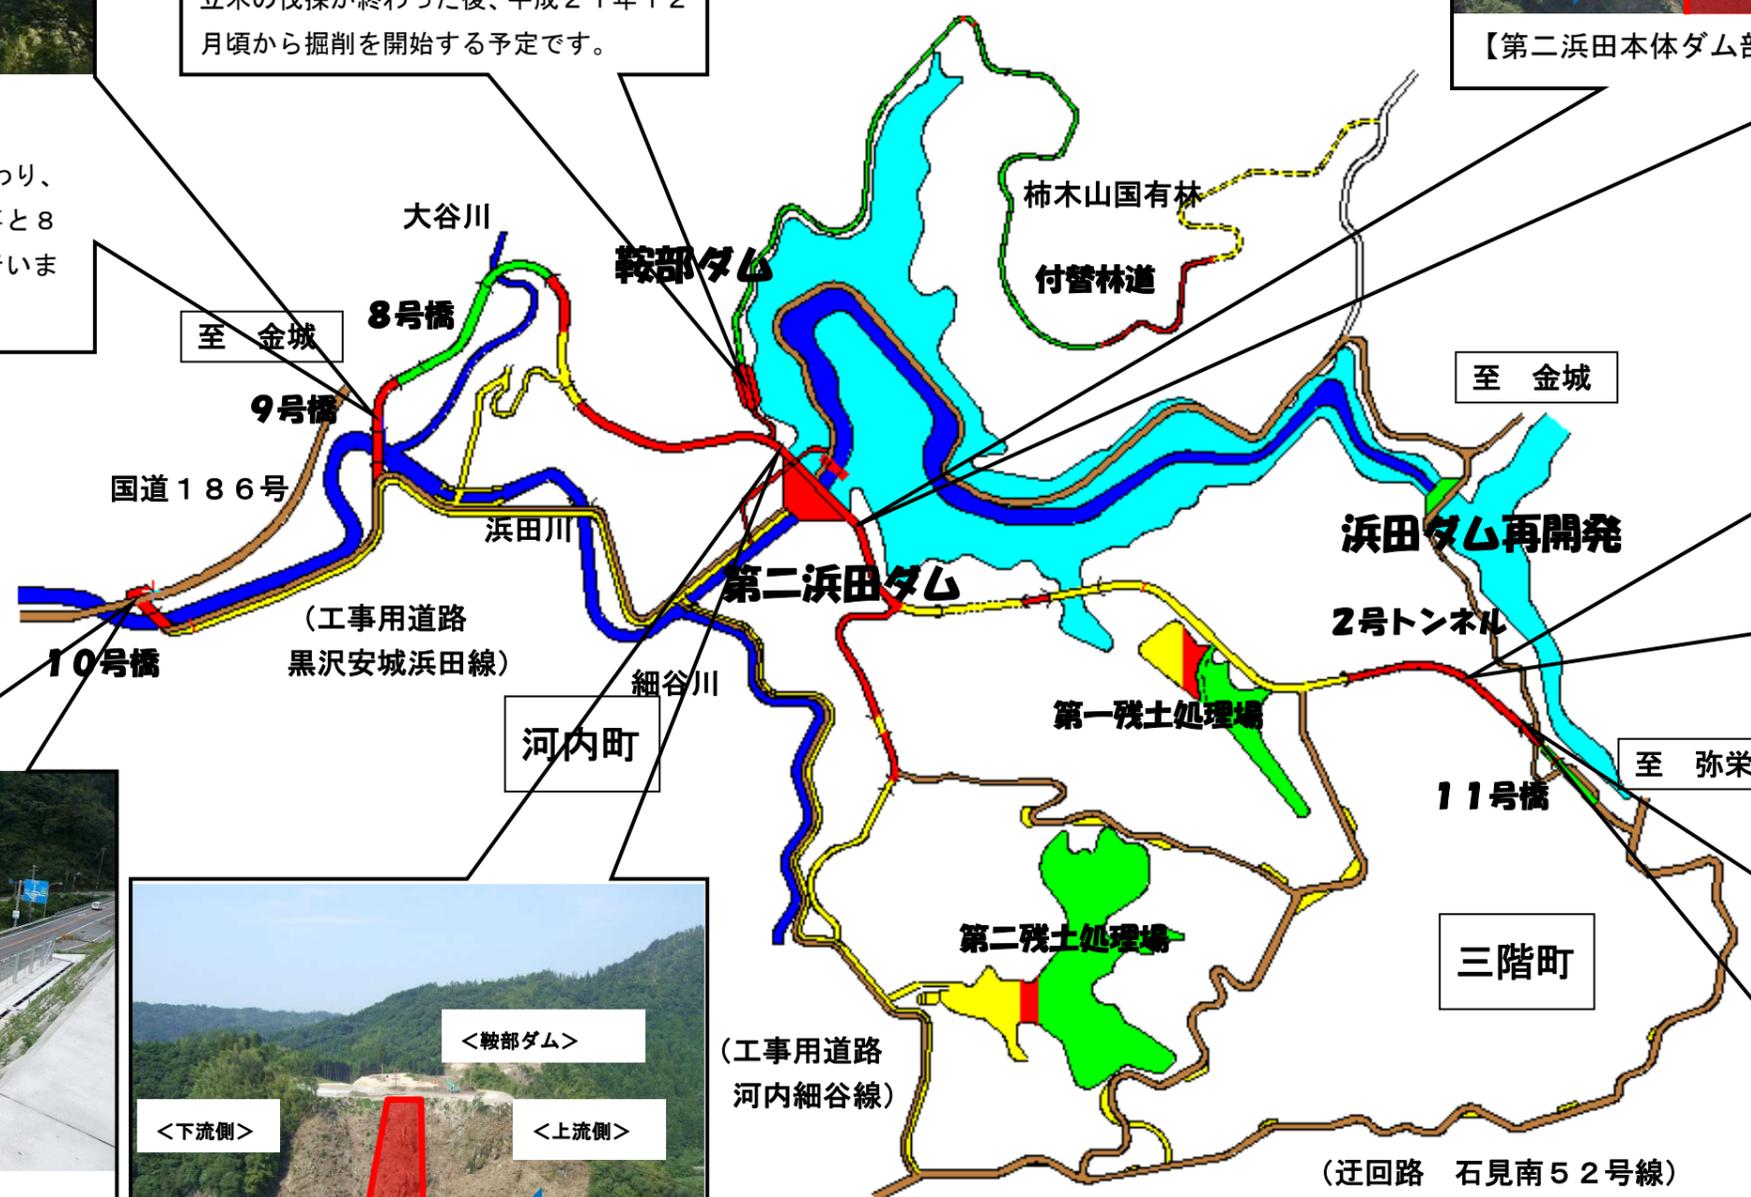

【11号橋施工状況】

現在、橋梁の下部工の工事を行っているところです。平成21年12月に完成する予定です。

工事中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

