

土木部門  
道路



事務所名 松江県土整備事務所  
 工事名 国道432号 大庭バイパス  
 道路改築工事 その16  
 施工業者 松江土建(株)

工事概要 施工延長 L=100m  
 盛土工 V=1180m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 L=337m  
 舗装工 A=2129m<sup>2</sup>  
 区画線工 L=1261m  
 道路照明設置工 N=7基  
 電線共同溝工 L=47m


土木部門  
道路



事務所名 雲南県土整備事務所  
 工事名 出雲三刀屋線 伊萱工区  
 道路改築工事 第1期  
 施工業者 (株) 都間土建

工事概要 施工延長 L=695m  
 盛土工 V=37,054m<sup>3</sup>  
 大型水路工 L=346m  
 ボックスカルバート工 L=13.0m  
 寺谷川護岸工(ブロック積工) A=60m<sup>2</sup>  
 ブロック積工(河川管理道路) A=142m<sup>2</sup>  
 大型ブロック積工(河川管理道路) A=112m<sup>2</sup>

土木部門  
道路

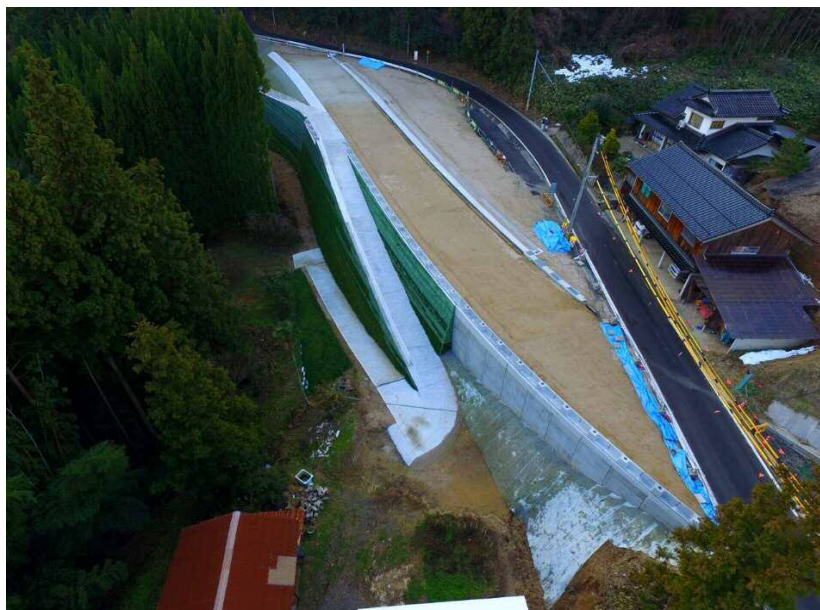

事務所名 雲南県土整備事務所  
工事名 出雲奥出雲線  
前根波禪定工区 道路改築工事  
施工業者 梅木建設(株)

工事概要 工事延長 L=102m  
補強土壁工 A=731m<sup>2</sup>  
盛土工 V=1,924m<sup>3</sup>  
側溝工 L=72m  
ガードレール基礎 L=60m  
転落防止柵 L=74m

土木部門  
道路



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 矢尾今市線 大塚工区  
道路改築工事 第13期  
施工業者 (株)中筋組

工事概要 施工延長 L=14m  
T形橋脚 N=2基  
鋼管杭 N=21本



土木部門  
道路



事務所名 出雲県土整備事務所  
 工事名 出雲奥出雲線 野尻2工区  
 道路改築工事 第3期  
 施工業者 (株) 今岡興産

工事概要 工事延長 L=327m  
 逆T式橋台 N=1基  
 路床盛土工 V=520m<sup>3</sup>  
 路体盛土工 V=2,200m<sup>3</sup>  
 法面整形工 A=70m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 L=116m  
 擁壁工 L=14m 補強土壁工 A=46m<sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名 県央県土整備事務所  
 工事名 国道375号 美郷工区 災害防除工  
 事  
 施工業者 (株) オーサン

工事概要 施工延長 L=247m  
 ポケット式落石防止網工 A=350m<sup>2</sup>  
 覆式落石防止網工 A=83m<sup>2</sup>  
 高エネルギー吸収型落石防護網工  
 A=2622m<sup>2</sup> L=27m  
 (県単緊急)  
 施工延長 L=34m  
 ポケット式落石防止網工 A=240m<sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名 県央県土整備事務所  
工事名 大田井田江津線外2線  
道路災害復旧工事  
30災9号~13号  
施工業者 東幸建設(株)

工事概要 工事延長 L=521m  
下層路盤工 A=1129m<sup>2</sup>  
上層路盤工 A=1501m<sup>2</sup>  
基層工 A=2672m<sup>2</sup>  
表層工 A=3156m<sup>2</sup>  
区画線工 L=1289m  
舗装版取壊工 A=3140m<sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名 県央県土整備事務所  
工事名 川本大家線 三俣工区  
災害防除工事  
施工業者 平成建設(有)

工事概要 施工延長 L=52.8m  
吹付法枠工 A=566m<sup>2</sup>



土木部門  
道路



事務所名 浜田県土整備事務所  
工事名 浅利渡津線 渡津工区  
道路改築 舗装工事  
施工業者 今井産業（株）

工事概要 施工延長 L=701m  
アスファルト舗装工（車道部） A=5283m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工（歩道部） A=857m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工（その他） A=1068m<sup>2</sup>  
踏掛版工 V=40m<sup>3</sup>、大型標識工 N=4基  
小型標識工 N=1式、区画線工 L=6131m  
道路照明 N=1基

土木部門  
道路



事務所名 浜田県土整備事務所  
工事名 弥栄旭インター線 小坂工区  
災害防除工事 その1  
施工業者 イワミ工業（株）

工事概要 施工延長 L=211m  
ポケット式落石防護網 A=1,400m<sup>2</sup>  
法枠工 A=343m<sup>2</sup>

土木部門  
道路



事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 三隅美都線 宇津川2工区  
道路改築工事 第9期  
施工業者 大畑建設(株)

工事概要 工事延長 L=281.2m  
掘削工 V=25,110m<sup>3</sup>  
路体盛土工 V=2,800m<sup>3</sup>  
路床盛土工 V=800m<sup>3</sup>  
厚層基材吹付工 A=4,170m<sup>2</sup>  
グラウンドアンカー工 N=71本(L=868m)  
横ポーリング工 N=6本(L=240m)  
排水路工 L=249m、転落防止柵工 L=116m

土木部門  
道路




事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 三隅美都線 宇津川2工区  
道路改築工事 第10期  
施工業者 日新建設(株)

工事概要 工事延長 L=7.0m  
2号橋A2橋台 N=1基(H=14m)  
杭基礎φ2,000 L9.0m×2本 L8.5m×2本  
伐採工 A=2,146m<sup>2</sup>  
仮設工事用道路 N=1式



土木部門  
道路

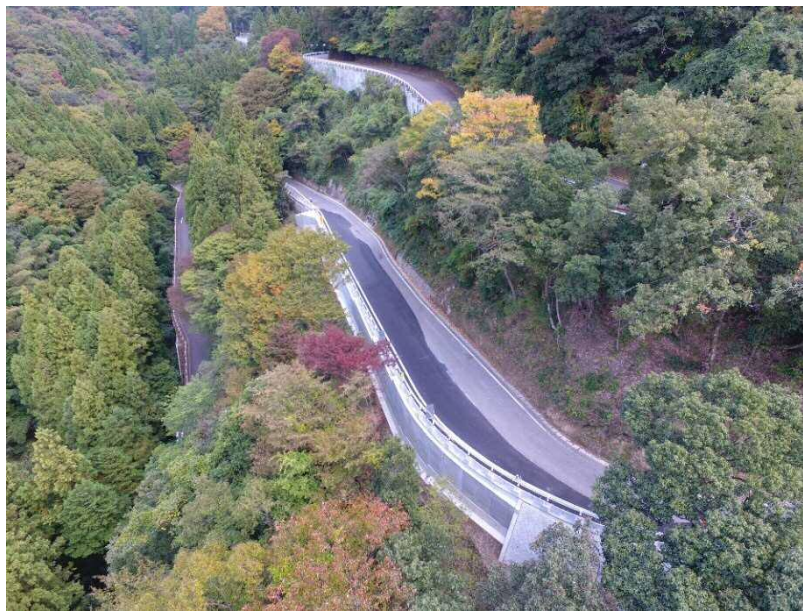

事務所名 益田県土整備事務所  
工事名 須川谷日原線 日原工区  
道路改築工事  
施工業者 (株)野村組

工事概要 工事延長 L=152m  
軽量盛土工（現場発泡ウレタン工）V=595m<sup>3</sup>  
コンクリートブロック積工A=33m<sup>2</sup>  
路側防護柵工 L=151m  
鉄筋挿入工 N=15本

土木部門  
道路



事務所名 隠岐県土整備事務所  
工事名 西郷布施線 大久工区 災害防除工事  
施工業者 (株)竹田組

工事概要 施工延長 L=44.9m  
地山補強土工 L=44.9m A=264m<sup>2</sup>  
補強材設置 N=133本

土木部門  
道路



事務所名 浜田河川総合開発事務所  
工事名 黒沢安城浜田線 長見工区  
道路改築 その4工事  
桜湖橋上部工  
施工業者 極東興和(株) 松江営業所

工事概要 橋梁上部工  
橋長 L=50.0m  
幅員 W=5.5(6.5)m  
形式 PC単純箱桁橋



土木部門  
河川



事務所名 雲南県土整備事務所  
工事名 神戸川 河川改修  
首棚堰下部工事  
施工業者 森島建設(株)

工事概要 施工延長L=59.5m  
首棚堰下部工 L=17.3m  
魚道工 L=21.5m  
護床ブロック積 N=159個  
護岸ブロック L=23m

土木部門  
河川



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 塩冶赤川 河川改修工事  
天神北橋下部工  
施工業者 今岡工業(株)

工事概要 施工延長 L=35.5m  
逆T式橋台 N=2基  
場所打杭工 N=8本  
護岸工 A=159m<sup>2</sup>

土木部門  
河川



事務所名 出雲県土整備事務所  
工事名 塩冶赤川 河川緊急整備工事  
堀西南橋下部工  
施工業者 (株)トガノ建設

工事概要 施工延長 L=37.1m  
河川掘削工 V=1,600m<sup>3</sup>  
逆T式橋台 N=2基  
鋼管杭工 N=16本  
法覆護岸工 A=541m<sup>2</sup>

土木部門  
河川



事務所名 県央県土整備事務所  
工事名 出羽川 三日市工区  
河川緊急整備工事  
施工業者 (有)町田土建

工事概要 工事延長 L=60.2m  
コンクリートブロック積 A=278m<sup>2</sup>



土木部門  
港湾空港



事務所名 県央県土整備事務所  
工事名 久手港 統合補助工事 第3期  
施工業者 黒徳建設(株)

工事概要 工事延長 L=37.8m  
捨石(10-200kg/個) V=1,776m<sup>3</sup>  
被覆石(1t/個) V=497m<sup>3</sup>  
被覆ブロック4t運搬・据付 V=291個  
被覆ブロック製作 N=70個

土木部門  
港湾空港



事務所名 浜田港湾振興センター  
工事名 浜田港 福井地区  
荷役機械基礎工事  
施工業者 祥洋建設(株)

工事概要 延長 L=177.5m  
地盤改良工(SCP) N=485本  
地盤改良工(SAVE-SP) N=34本  
海桁工 L=155.9m、陸桁工 L=155.9m  
エプロン舗装工 A=2,639m<sup>2</sup>  
レール(陸桁)嵩上 N=1式  
基礎金物設置 N=1式、係船柱 N=1基  
水道管移設 N=1式

土木部門  
砂防



事務所名 雲南県土整備事務所  
 工事名 掛屋A地区  
 急傾斜地崩壊対策工事  
 施工業者 (有) 細貝組

工事概要 工事延長 L=81m  
 掘削工 V=970m<sup>3</sup>  
 吹付法砕工 A=541m<sup>2</sup>  
 重力式擁壁工 V=91m<sup>3</sup>  
 水路工 L=79m  
 仮設防護柵 L=37m

土木部門  
砂防



事務所名 出雲県土整備事務所  
 工事名 正応寺川  
 通常砂防工事 第3期  
 施工業者 (有) 嘉村建設

工事概要 鋼製補強土堰堤工  
 N=1基 (H=12m、L=36m)  
 掘削工 V=3,280m<sup>3</sup>  
 コンクリートブロック工 A=233m<sup>2</sup>  
 道路用側溝 L=5m  
 水質試験 1式 土質試験 1式



土木部門  
砂防



事務所名 浜田県土整備事務所  
工事名 海老谷川  
砂防設備災害復旧工事  
29災298号  
施工業者 第一建設工業(株)

工事概要 堰堤工 H=8.5m L=44.5m V=1,443m<sup>3</sup>  
コンクリートブロック積工 A=47m<sup>2</sup>  
コンクリートブロック張工 A=144m<sup>2</sup>  
側壁工 V=56m<sup>3</sup>  
水叩工 V=61m<sup>3</sup>

土木部門  
都市計画



事務所名 雲南県土整備事務所  
工事名 新庄飯田線 3工区  
街路事業 舗装工事  
施工業者 雲南建設(株)

工事概要 工事延長 L=408m  
排水性舗装  
表層工 A=4,090m<sup>2</sup> 基層工 A=2,280m<sup>2</sup>  
上層工 A=1,940m<sup>2</sup>  
カラー舗装(歩道) A=2,067m<sup>2</sup>  
取付舗装  
表層工 A=773m<sup>2</sup> 上層工 A=647m<sup>2</sup>  
道路照明灯 N=8基 点字シート L=825m
