


農林水産部門
農業土木



事務所名	雲南県土整備事務所	工事概要	施工延長 L=585m
工事名	農地整備事業 幡屋地区 道路その1 O工事		掘削工 V=12840m ³
			路体盛土工 V=13020m ³
			安定処理工 V=14450m ³
施工業者	(株)常松土建		法面工 A=2730m ²
			水路工 L=117m
			ボックスカルバート工 L=22m

農林水産部門
農業土木

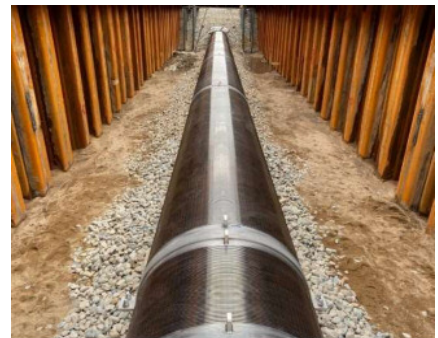

事務所名	出雲県土整備事務所	工事概要	工事延長 L=54m
工事名	農地耕作条件改善事業 斐川下阿宮地区 取水施設整備その2工事		集水埋渠工 (フィルター材設置) L=43.5m
			吸込水槽工 N=1基
			スライドゲート製作据付工 N=1基
施工業者	(株)フクダ		仮締切撤去工 L=220.8m
			仮設土留撤去工 L=133.6m
			仮設工事用道路撤去工 L=353.1m

農林水産部門
農業土木



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	区画整理工	A=12.0ha
工事名	中山間地域総合整備事業 浜田東部地区 上府工区 区画整理工事		道路工	L=2127m
			排水路工	L=3060m
			補償工事	N=一式
			仮設工	N=一式
施工業者	(株)山重組			

農林水産部門
農業土木



事務所名	益田県土整備事務所	工事概要	区画整理工	
工事名	真田地区 区画整理工事		整地工	A=5.77ha
			用水路工	L=1449m
			排水路工	L=416m
			道路工	L=391m
施工業者	開盛建設(株)			

農林水産部門
森林土木



事務所名 出雲県土整備事務所
工事名 予防治山事業 奥の谷 溪間工事
施工業者 (有)金築組

工事概要 谷止工 $V=215.1\text{m}^3$

農林水産部門
森林土木



事務所名 出雲県土整備事務所
工事名 災害関連緊急治山事業 小弁堂 山腹工事
施工業者 今岡工業(株)

工事概要 山腹工
掘削工 $V=11,991\text{m}^3$
法切工 $V=3,505\text{m}^3$
モルタル吹付工 $A=488.5\text{m}^2$
吹付法枠工 $A=8,188.8\text{m}^2$

農
林
水
産
部
門
森
林
土
木



事務所名	浜田県土整備事務所	工事概要	谷止工 3基	$V=1,017.5\text{m}^3$
工事名	復旧治山事業 橋の谷地区 溪間工事		床固工 2基	$V=141.2\text{m}^3$
			流路工	$L=42.4\text{m}$
施工業者	(有)住江建設		附帯流路工	$L=64.1\text{m}$

農林水産部門
漁港漁場



事務所名 東部農林水産振興センター
 工事名 大社漁港海岸 海岸環境工事
 施工業者 (株)中筋組

工事概要 施工延長 L=230.9m
 護岸工 L=85.9m
 盛土工 V=1500m³
 ブロック製作・据付 N=566個
 水叩工 L=145.0m
 排水施設工 N=1式
 植栽工 L=73.5m

農林水産部門
漁港漁場



事務所名 隠岐支庁農林水産局
 工事名 水産生産基盤整備事業 西郷漁港 ー
 5.5m岸壁工事
 施工業者 (株)金田建設

工事概要 ー5.5m岸壁 L=40.0m
 鋼管杭打設 N=4本
 本体工 L=40.0m
 上部工 L=40.0m
 舗装工 L=40.0m
 付属工 N=1式
 仮設工 N=1式
