波積ダムニュース　（第6号）

令和２年１０月
島根県浜田河川総合開発事務所

☆波積ダム本体

現在、波積ダム本体建設工事では、粗掘削が完了し、コンクリート打設に向け仕上げ掘削と岩盤清掃を着々と進めています。

R2.9.28ドローン写真【安藤・間・今岡工業・原工務所JV】

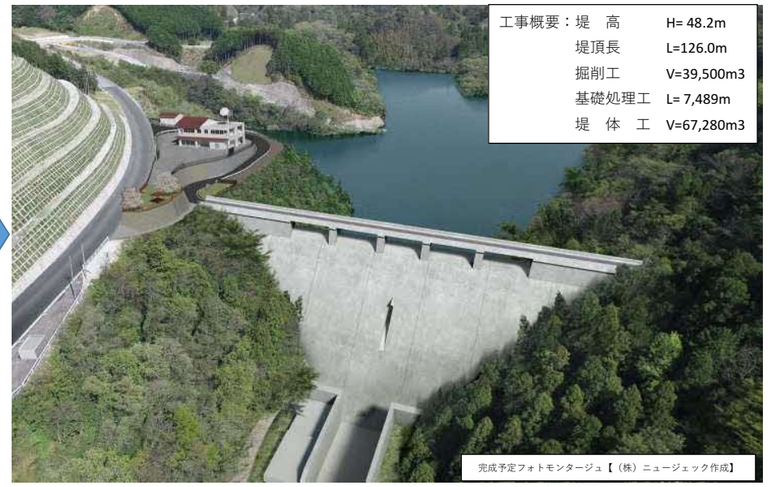

完成予定フォトモンタージュ【（株）ニュージェック作成】

全　体　工　程

【令和2年9月時点】　※各工程については工事の進捗により変更する場合があります。

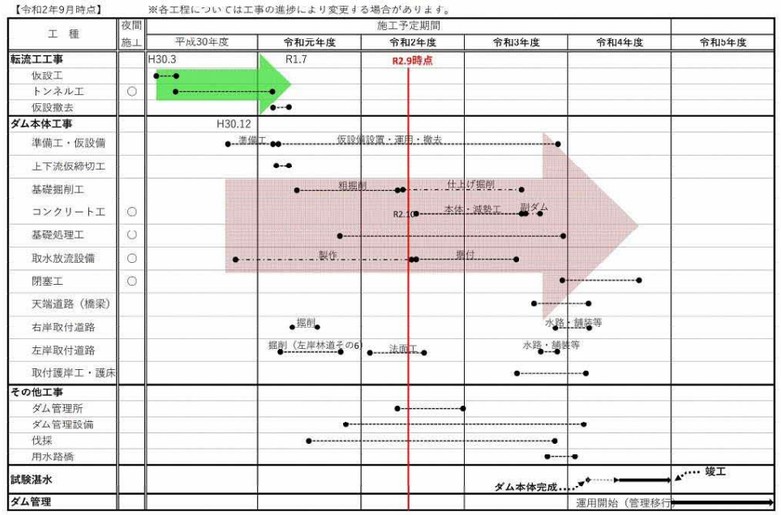

☆波積ダム管理所　建築工事

令和2年9月から管理所の建築工事に着手し、令和２年度内の完成を予定しています。
江津市特産の石州瓦を使用し、地域に馴染んだ建物となるよう配慮しています。
※屋根や外壁の色はあくまでイメージです。

完成イメージ図【（有）近代設計作成】

令和２年度波積ダム建設事業平面図

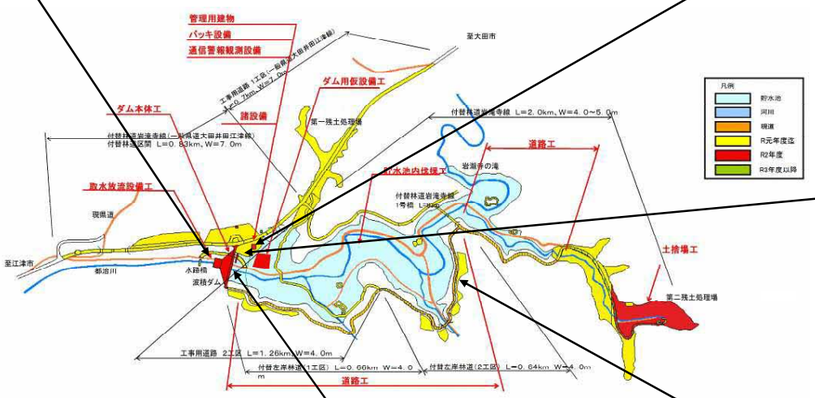

☆波積ダム　周辺整備

周辺整備計画検討委員会でご検討いただいた結果を基に、下図のように計画しています。
工事は令和３年度の夏頃から行う予定です。

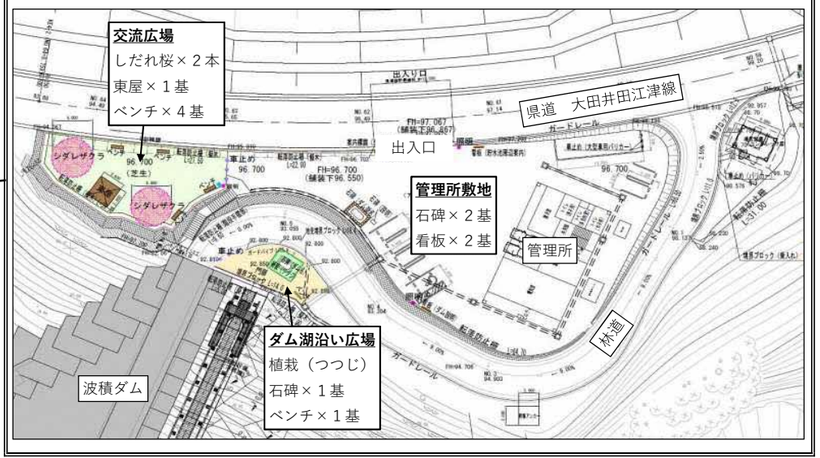

☆波積ダム限定　缶バッジ・クリアファイルを作成しました！！

波積ダム見学に参加された皆様方に、職員がデザイン・作成したオリジナルの缶バッジとクリアファイルを配布しています。どちらも数に限りがあります。欲しい方は是非、波積ダム見学にお申し込みください！

【クリアファイル】
○A4サイズのクリアファイル
当所職員がデザインしました！！
ダムマニアはもちろん、ダムに興味がない方でも愛用したくなるクオリティーの高さです。

【缶バッジ】
○直径３㎝の缶バッジ
当所職員がバッジ作成用の機材を使い1つ1つ作成しています！

〈ダム見学の概要〉
・見学実施日　火曜と木曜日（祝日、お盆、年末年始を除く）
・見学時間　①10:00～11:00　②14:00～15:00　③15:00～16:00
・受け入れ人数　1団体 5名～20名（要相談）

【浜田河川HP】

☆波積ダム本体建設工事　仕上げ掘削

R2.8月まで発破や重機を用いた掘削作業を行ってきました。これを粗掘削といいますが、現在は、仕上げ掘削という作業を行っています。ダムは堅い基礎地盤の上に造るものです。重機等を用いた掘削では地盤に亀裂や緩みが生じる可能性があるため、人力により丁寧に掘削作業を行います。

☆付替左岸林道

道路斜面を保護するための植生吹付作業および道路側溝の据え付けが完了しました。今後舗装を行い、Ｒ２年度内に付替林道の一部区間を完成させます。
